


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

| | |
|----------------------------------|--|
| N.º de Inventário | LG 2.2.03 |
| Designação | Urbanização Cerro das Mós |
| Categoria | Tipologia |
| 02 - Espaços Verdes Residenciais | Espaços Verdes Coletivos de Áreas Residenciais |

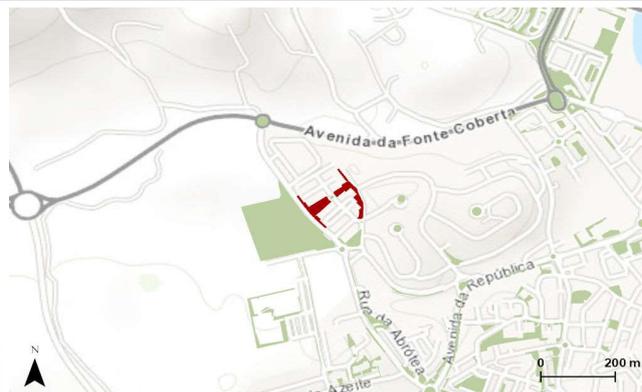

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Horário de Funcionamento | Vigilância/Segurança | Freguesia |
| Permanente | Não | São Gonçalo de Lagos |

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

| | |
|-----------------|-------|
| Área Total (m2) | 3 884 |
|-----------------|-------|

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

| | | |
|---|--|---|
| Coberto Arbóreo | Área total (m2) | 726,6 |
| | Espécies predominantes | <i>Albizia julibrissin</i> / <i>Celtis australis</i> / <i>Ceratonia siliqua</i> / <i>Cercis siliquastrum</i> / <i>Fraxinus angustifolia</i> / <i>Robinia pseudoacacia</i> |
| | Estado fitossanitário global | Bom |
| | Arborização em caldeiras | N.A. |
| Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento | Área total (m2) | 2 020,0 |
| | Espécies arbustivas predominantes | <i>Euonymus japonicus</i> / <i>Prunus laurocerasus</i> |
| | Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes | <i>Rosmarinus officinalis</i> 'Prostratus' |
| | Estado fitossanitário global | Bom |
| | Adequação do coberto | Coberto insuficiente |
| | Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2) | 0,0 |
| Prados e Relvados | Área total (m2) | 985,6 |
| | Estado fitossanitário global | Razoável |

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------|
| Pavimentos | <i>Área total pavimentada (m2)</i> | 780,7 |
| | <i>Tipos de pavimento</i> | Pavê Hexagonal |
| | <i>Estado de conservação</i> | Bom |
| | <i>Delimitação/ Contenção de pavimentos</i> | Bem definidos |
| Revestimento de Solo | <i>Área total (m2)</i> | 97,8 |
| | <i>Tipos de revestimento</i> | Gravilha |
| Estruturas Construídas | <i>Tipos de estruturas construídas</i> | Muros / Escadarias |
| | <i>Estado de conservação</i> | Bom |

V. EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Equipamentos e Serviços | <i>Tipo</i> | - |
| Mobiliário | <i>Tipo</i> | Bancos / Papeleiras |
| | <i>Estado de conservação</i> | Razoável |
| Iluminação Pública | <i>Tipo</i> | Candeeiros públicos |
| | <i>Estado de conservação</i> | Razoável |
| Sinalética e Informação | <i>Painéis informativos</i> | Ausentes |

VI. REGA E MANUTENÇÃO

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Tipologias de Rega | <i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i> | 0,0 |
| | <i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i> | 2 020,4 |
| | <i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i> | 0,0 |
| Consumos de Água | <i>Volume total anual (m3)</i> | - |
| | <i>Custo total anual (€)</i> | - |
| Origem da Água para Rega | <i>Origem</i> | Sem informação |
| Programadores e Controladores | <i>Sistema de controlo central</i> | Não |
| | <i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i> | 1 |
| Caixas de Rega | <i>Quantidade (n.º)</i> | 7 |
| Tubagem | <i>Diâmetros</i> | Rede primária - Tubagem de PEAD 1Mpa, Ø 63mm Rede secundária - Tubagem em PEAD 1Mpa, Ø 40mm |

VII. ACESSIBILIDADE

| | | |
|--|---|--------------|
| Acessibilidade ao Espaço Verde | <i>Estacionamento automóvel</i> | Sim |
| | <i>Transportes públicos</i> | Não |
| Acessibilidade dentro do Espaço Verde | <i>Acessibilidade a cadeiras de rodas</i> | Parcialmente |

VIII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

A informação relativa ao sistema de rega (caixas, programadores e tubagens) foi retirada do projeto de rega do projeto "Cerro das Mós ", do ano de 2004. Esta informação poderá estar desatualizada, pois no local, aquando do levantamento de campo (ano 2021), observaram-se alterações de desenho do espaço e rega comparativamente ao projeto original.
