


# PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

## FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

### I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.5.03
Designação	Urbanização Varandas de São João
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Rotundas, Separadores e Canteiros

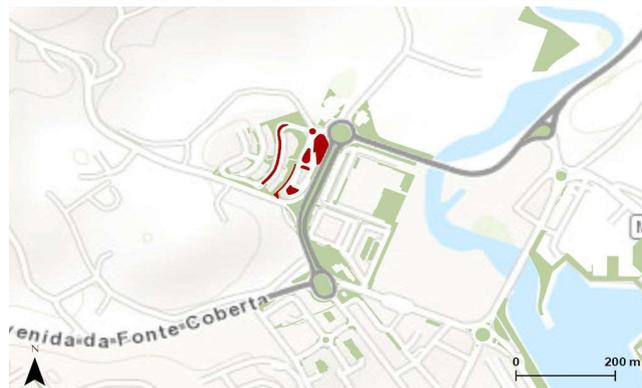

Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

### II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	2 896
-----------------	-------

### III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

<b>Coberto Arbóreo</b>	Área total (m2)	730,3
	Espécies predominantes	<i>Celtis australis</i> / <i>Ceratonnia siliqua</i> / <i>Prunus amygdalus</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
<b>Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento</b>	Área total (m2)	2 040,8
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Arbutus unedo</i> / <i>Crataegus monogyna</i> / <i>Spiraea cantoniensis</i> / <i>Hebe andersoni</i> / <i>Eleagnus angustifolia</i> / <i>Punica granatum</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus spp.</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i> 'Prostratus' / <i>Lonicera japonica</i> / <i>Lavandula spica</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
<b>Prados e Relvados</b>	Área total (m2)	553,2
	Estado fitossanitário global	Bom

### IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

<b>Pavimentos</b>	Área total pavimentada (m2)	302,0
	Tipos de pavimento	lajetas "pavê" de betão
	Estado de conservação	Bom
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	Bem definidos
<b>Revestimento de Solo</b>	Área total (m2)	0,0
	Tipos de revestimento	-

<b>Estruturas Construídas</b>	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

#### V. REGA E MANUTENÇÃO

<b>Tipologias de Rega</b>	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	553,2
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	1 899,8
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0

<b>Consumos de Água</b>	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-

<b>Origem da Água para Rega</b>	<i>Origem</i>	Sem informação
---------------------------------	---------------	----------------

<b>Programadores e Controladores</b>	<i>Sistema de controlo central</i>	-
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	2

<b>Caixas de Rega</b>	<i>Quantidade (n.º)</i>	2
-----------------------	-------------------------	---

<b>Tubagem</b>	<i>Diâmetros</i>	Rede primária - Tubagem de PEAD 1Mpa, Ø 80mm
		Rede secundária - Tubagem em PEAD 1Mpa, Ø 40mm

#### VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

A informação relativa ao sistema de rega (caixas, programadores e tubagens) foi retirada do projeto de rega da "Tapada (Varandas) de S. João", do ano de 2004. Esta informação poderá estar desatualizada, pois no local, aquando do levantamento de campo (ano 2021), observaram-se alterações de desenho comparativamente ao projeto original.
