


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.5.21
Designação	Avenida da República
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Rotundas, Separadores e Canteiros

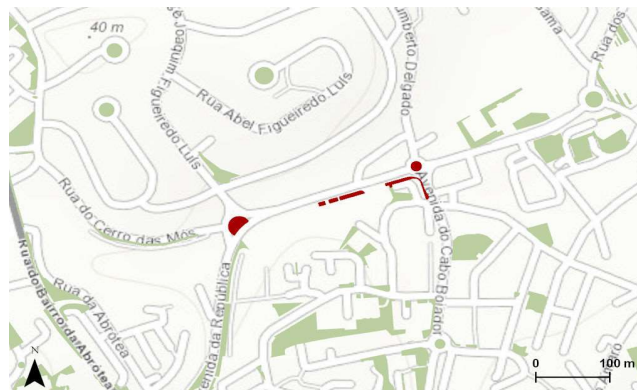

Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	1 027
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	230,2
	Espécies predominantes	Jacaranda mimosifolia / Prunus cerasifera var. atropurpurea
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	607,6
	Espécies arbustivas predominantes	Callistemon spp. / Chamaerops humilis / Cyca revoluta / Hibiscus rosa-sinensis / Lantana camara / Nerium oleander /
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	Agapanthus spp. / Carex comans / Festuca glauca / Hypericum calycinum / Iris spp. / Rosa spp.
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Coberto insuficiente
Prados e Relvados	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
	Área total (m2)	320,4
	Estado fitossanitário global	Bom

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	49,8
	Tipos de pavimento	Cubo de granito
	Estado de conservação	Bom
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	Bem definidos
Revestimento de Solo	Área total (m2)	49,2
	Tipos de revestimento	Gravilha / areias

Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	320,4
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	607,5
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	0,0

Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-

Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
---------------------------------	---------------	----------------

Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	-

Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	2
-----------------------	-------------------------	---

Tubagem	<i>Diâmetros</i>	-
----------------	------------------	---

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Existência de 1 contador de água.

Existência de palmeiras (*Phoenix canariensis*) mortas - necessidade de remoção e limpeza.
