


PLANO DE GESTÃO DA ESTRUTURA VERDE URBANA DE LAGOS

FICHA DE INVENTÁRIO DOS ESPAÇOS VERDES

I. INFORMAÇÃO GERAL

N.º de Inventário	LG 5.5.59
Designação	Rua Dr Nataniel Costa x Estrada do Monte Carapeto
Categoria	Tipologia
05 - Infraestrutura Viária, Ferroviária e Pedonal	Rotundas, Separadores e Canteiros

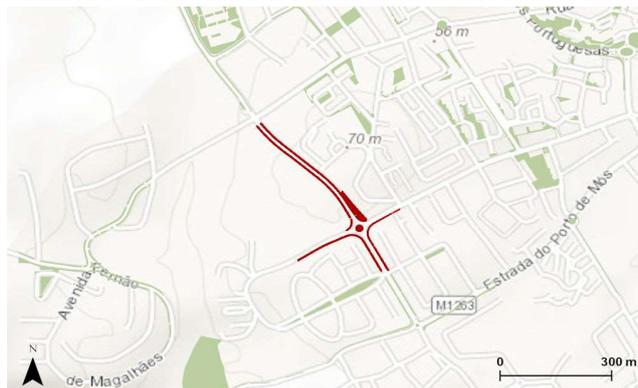

Horário de Funcionamento	Vigilância/Segurança	Freguesia
Permanente	Não	São Gonçalo de Lagos

II. DIMENSÕES DO ESPAÇO VERDE

Área Total (m2)	6 412
-----------------	-------

III. COBERTURA E REVESTIMENTO VEGETAL

Coberto Arbóreo	Área total (m2)	395,9
	Espécies predominantes	<i>Ceratonia siliqua</i> / <i>Cercis siliquastrum</i> / <i>Cupressus sempervirens</i> / <i>Punica granatum</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Arborização em caldeiras	N.A.
Coberto Arbustivo, Subarbustivo e Herbáceo de Revestimento	Área total (m2)	1 914,4
	Espécies arbustivas predominantes	<i>Abelia grandiflora</i> / <i>Arbutus unedo</i> / <i>Lantana camara</i>
	Espécies subarbustivas e herbáceas predominantes	<i>Agapanthus umbellatus</i> / <i>Rosmarinus officinalis</i> 'Prostratus' / <i>Trachycarpus fortunei</i>
	Estado fitossanitário global	Bom
	Adequação do coberto	Compasso de plantação adequado
	Área de espaços naturalizados ou inacessíveis (m2)	0,0
Prados e Relvados	Área total (m2)	4 258,2
	Estado fitossanitário global	Mau

IV. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS

Pavimentos	Área total pavimentada (m2)	109,6
	Tipos de pavimento	Cubo de calcário
	Estado de conservação	Bom
	Delimitação/ Contenção de pavimentos	Bem definidos
Revestimento de Solo	Área total (m2)	129,8
	Tipos de revestimento	Casca de pinheiro / Gravelha colorida

Estruturas Construídas	<i>Tipos de estruturas construídas</i>	-
	<i>Estado de conservação</i>	N.A.

V. REGA E MANUTENÇÃO

Tipologias de Rega	<i>Área de rega por aspersão ou pulverização (m2)</i>	73,6
	<i>Área com rega localizada (gota-a-gota) (m2)</i>	1 914,4
	<i>Área com rega manual e/ou em regime de sequeiro (m2)</i>	4 184,6

Consumos de Água	<i>Volume total anual (m3)</i>	-
	<i>Custo total anual (€)</i>	-

Origem da Água para Rega	<i>Origem</i>	Sem informação
---------------------------------	---------------	----------------

Programadores e Controladores	<i>Sistema de controlo central</i>	Não
	<i>Quantidade de programadores no local (n.º)</i>	1

Caixas de Rega	<i>Quantidade (n.º)</i>	8
-----------------------	-------------------------	---

Tubagem	<i>Dímetros</i>	Tubagem PEAD PN10 de 40mm
		Tubagem PEAD PN8 de 32mm /25mm

VI. OUTRAS OBSERVAÇÕES

A informação relativa ao sistema de rega (caixas, programadores e tubagens) foi retirada do projeto de rega do projeto de loteamento urbano "Porto de Mós", do ano de 2000. Esta informação poderá estar desatualizada, pois no local, aquando do levantamento de campo (ano 2021), observaram-se alterações de desenho comparativamente ao projeto original.
